



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2571690	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DEL I.E.S.P.P GREGORIA SANTOS, DISTRITO DE SICUANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	UEI GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE PROYECTOS	PMI AÑO 1 <2027>	372.500
		PMI AÑO 2 <2028>	10.314.393
		PMI AÑO 3 <2029>	9.725.100

2. FOTOGRAFÍAS

3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

INICIO:

CULMINACIÓN:

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (i)




AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (i)



Fecha de declaración:

VER DETALLE DEL AVANCE:

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (S/ MM)



Variación	Porcentaje (%)
Respecto a la viabilidad	0% (S/ 0 MM)

SITUACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INVERSIÓN

[06/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente
SE ENCUENTRA EL PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROBLEMAS O RESTRICCIONES IDENTIFICADAS PARA LA EJECUCIÓN

[06/07/2026] - Otras restricciones (detalle en campo adicional)
CORDINACIONES CON EL MEF POR DESACTIVACION D E LA INVERSION

PRÓXIMOS PASOS O ACCIONES PARA IMPLEMENTAR

[06/07/2026] - Ejecutar acciones para levantar restricciones críticas (saneamiento, interferencias, permisos, conflictos, etc.).
Los beneficiarios deben tramitar el saneamiento físico legal del predio.



4. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN	S/
ACTUALIZADO:	21.074,231
DEVENGADO ACUMULADO:	S/ 17,380
PRIMER DEVENGADO:	AGO-2024
ULTIMO DEVENGADO:	JUL-2026

% DE AVANCE ACUMULADO




PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL (S/)		
2027	2028	2029
372,500	10,314,393	9,725,100




AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN 2026

PIM 2026 (a):	S/ 646,359
DEVENGADO 2026 :	S/ 1,500
PROGRAMACION FINANCIERA ACTUALIZADA al 02/06/2026 (b):	S/ 646,359
DEFICIT O SALDO (a-b):	S/ 0

% DE AVANCE PIM 2026



PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACUMULADA (S/ MM)

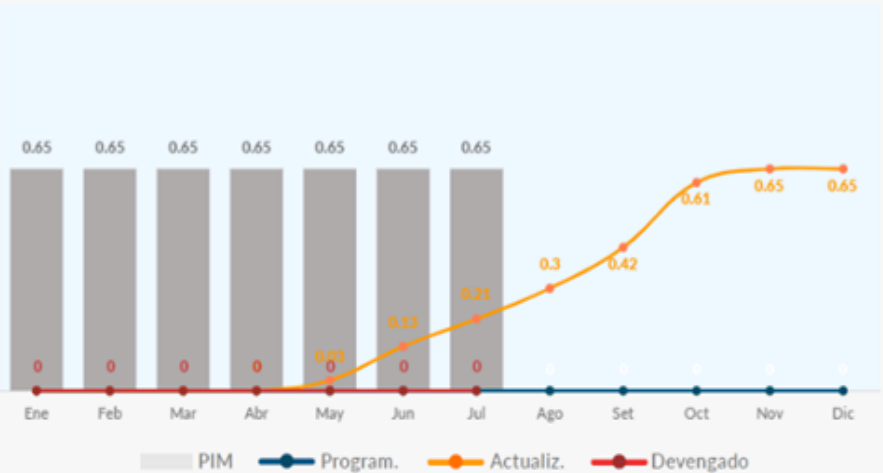

EJECUCIÓN FINANCIERA 2026 (S/)												
Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Prog. Financ. Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prog. Financ. Actualizada	-	-	-	-	27,845	99,568	81,646	95,061	116,379	191,675	34,184	-
Devengado	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-

FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 27/12/2022 16:06:23 - Fecha de viabilidad: 30/12/2022 16:20:26

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio ya los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DEL I.E.S.P.P GREGORIA SANTOS, DISTRITO DE SICUANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	
Código único de inversiones	2571690
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?	NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO

A. Alineamiento a una brecha prioritaria	
Función	22 EDUCACIÓN
División funcional	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	0108 EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Sector responsable	EDUCACION
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA
Servicio	SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Año	Valor	Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	PORCENTAJE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN CONDICIONES INADECUADAS	INSTALACIÓN EDUCATIVA	DEPARTAMENTAL			1

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nombre de la OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Responsable de la OPMI:	JUAN CARLOS CONDORI CAHUANA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nombre de la UF	UNIDAD FORMULADORA REGIONAL DE INVERSIONES - UFR
Responsable de la UF	VERONIKA JULIA CABEZUDO ZARATE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nombre de la UEI	UEI GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE PROYECTOS
Responsable de la UEI	MARIA MILAGROS OLAZAVAL RODRIGUEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	789 - REGION CUSCO-SEDE CENTRAL
------------------	---------------------------------

C. Formulación y Evaluación

Identificación

Unidad Productora:	Código	Nombre			
	0783399	GREGORIA SANTOS			
Naturaleza de intervención:	MEJORAMIENTO				
Servicio a intervenir:	DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DEL I.E.S.P.P GREGORIA SANTOS,				
Indique convenio del proyecto					
Localización geográfica de la unidad productora	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
	-14.2833556894487610 / -71.22086819213287	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	

Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-14.2733429821375890 / -71.22382935088501	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	
-14.5345372414738440 / -71.30448750157346	CUSCO	CANAS	KUNTURKANKI	
-14.2174541669614140 / -71.42831051449092	CUSCO	CANAS	YANA OCA	
-14.4306827516146170 / -71.27382967524450	CUSCO	CANAS	LANGUI	
-14.1465794196601780 / -71.45797343449094	CUSCO	CANAS	PAMPAMARCA	
-14.1001281486057670 / -71.42843744380247	CUSCO	CANCHIS	COMBAPATA	
-14.35659036394025 / -71.17100459134154	CUSCO	CANCHIS	MARANGANI	
-14.4924491444405690 / -71.15427842242553	CUSCO	CANAS	LAYO	
-14.2017267493521050 / -71.31487239748618	CUSCO	CANCHIS	SAN PABLO	
-14.1455160778152870 / -71.40319719954220	CUSCO	CANCHIS	TINTA	
-13.9803658866348820 / -71.41760097471926	CUSCO	CANCHIS	PITUMARCA	
-14.0256345016661350 / -71.45473960445676	CUSCO	CANCHIS	CHECACUPE	
-14.1740105273631920 / -71.37685041961910	CUSCO	CANCHIS	SAN PEDRO	
-14.47224732010949 / -71.39361410793332	CUSCO	CANAS	CHECCA	
-14.1628552808129560 / -71.47543920295043	CUSCO	CANAS	TUPAC AMARU	
-14.3799163383788990 / -71.45606478963741	CUSCO	CANAS	QUEHUE	

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto		ALUMNOS DEL I.E.S.P.P. "GREGORIA SANTOS" ACCEDEN AL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL SECTOR	
Nombre del indicador para la medición del objetivo central		Alumnos adecuadamente atendidos	
Unidad de medida del indicador		PERSONAS	
Línea de base (año)	2022	Valor del año base	726.00
Año de cumplimiento	2025	Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)	639.00
Fuente de información			

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos		Alumnos del I.E.S.P.P. "GREGORIA SANTOS"	
Unidad de medida de los beneficiarios directos		PERSONAS	
Último año del horizonte de evaluación	2034	Valor en el último del horizonte de evaluación	568
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación		5,806.00	

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	COMPONENTE 01: Se propone la optimización/remodelación de 04 bloques (A, B, C, H) y la construcción de 10 bloques, dos de ellos edificadas en 2 pisos (D, E) y ocho en un piso (F, G, I, J, K1, K2, K3, L) que albergarán 06 aulas, 01 biblioteca, 01 aula de cómputo, 01 centro de recursos tipo III, 02 laboratorios de idiomas, 01 laboratorio de ciencias, 01 SUM, ambientes de gestión administrativa, ambientes de bienestar estudiantil, ambientes de servicios generales, y SS.HH diferenciados por piso. Dichas unidades espacio - funcionales se articulan mediante galerías de circulación, corredores, escaleras y rampas de concreto. En cuanto a revestimientos interiores, se ha propuesto principalmente de manera general, muros de albañilería tarrajados y pintados, contrazócalos de madera, delorrasos de tarrajeo de cemento y pintura, pisos de parquet para ambientes básicos, pisos de porcelanato para SS.HH. ambientes de servicio sanitario, laboratorio, puertas batientes de madera ágüano con sobreluz, ventanas correderas de aluminio con vidrio templado, y todos los bloques con cobertura de teja andina. La tecnología estructural consiste en un sistema dual y/o aporticado con columnas y vigas de concreto armado, cerramientos de muros de ladrillo, entrepisos de losas aligeradas de concreto armado, con estructuras metálicas en cubierta. Construcción de 03 rampas de concreto simple y de concreto armado con pendiente de 10% cada una, escaleras integradas de concreto armado. Construcción de una losa deportiva de concreto simple con acabado de piso de poliuretano resistente a la abrasión y estructura metálica con cobertura de mallas Raschel con sistema corredero eléctrico. Optimización / remodelación de 24.71 m de cerco perimétrico existente. Construcción de cerco perimétrico de columnas y vigas de concreto armado con paños de muros de ladrillo, en una longitud de 1271.93 m. El proyecto contempla instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, e instalaciones especiales. COMPONENTE 02: Se plantea la adquisición de mobiliario y equipamiento, para cada ambiente y espacio planteado. Se adquirirán 1416 unidades de mobiliario y 393 unidades de equipamiento. COMPONENTE 03: Capacitación mediante el desarrollo de 04 talleres de 124 horas en total, dirigida a los docentes de los programas de Educación Primaria Intercultural Bilingüe y Educación en Idiomas: Especialidad Inglés, del I.E.S.P.P. Gregoria Santos.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años)	10
--------------------------------	----

Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicio de educación superior pedagógica: educación primaria intercultural bilingüe	Persona/año	302.00	327.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00
Servicio de educación superior pedagógica: educación en idiomas: especialidad Inglés	Persona/año	337.00	296.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Descripción de producto/acciones	Tipo de factor de producción	Unidad física		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado	Expediente técnico / doc. equivalente		Ejecución física	
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inicio	Fecha de término
1. Adecuada y suficiente infraestructura básica y complementaria para la prestación del servicio educativo										
Construccion de aula de educacion superior pedagogica :	Infraestructura	Aulas	6.00	M2	328.38	2,276,893.69	04/2023	07/2023	12/2023	09/2024
Construccion de aula de computo :	Infraestructura	Aulas	1.00	M2	70.84	327,759.49	04/2023	07/2023	12/2023	09/2024
Remodelacion de biblioteca : (incluye depósito de libros)	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	149.87	195,379.42	04/2023	07/2023	12/2023	09/2024
Construccion de biblioteca y/o centro de recursos : Centro de Recursos	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	54.73	253,222.43	04/2023	07/2023	12/2023	09/2024
Construccion de laboratorio y/o taller : Laboratorios de Idiomas	Infraestructura	Ambientes	2.00	M2	141.66	633,633.51	04/2023	07/2023	12/2023	09/2024
Construccion de laboratorio y/o taller : Laboratorios de Ciencias	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	91.83	410,748.02	04/2023	07/2023	12/2023	09/2024
Construccion de sala de usos multiples : (incluye cocineta y depósito)	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	238.50	1,084,316.25	04/2023	07/2023	12/2023	09/2024
Construccion de losa deportiva : (Losa multiuso tipo I, área de seguridad y tribuna)	Infraestructura	Espacios físicos	1.00	M2	750.41	777,020.34	04/2023	07/2023	04/2024	08/2024
Construccion de espacio exterior : (área de ingreso, estacionamiento vehiculos, estacionamientos motocicletas y bicicletas, área de socialización, patio de honor, áreas verdes)	Infraestructura	Espacios físicos	7.00	M2	6,481.09	1,854,439.18	04/2023	07/2023	04/2024	08/2024
Construccion de espacios de circulacion horizontal y/o vertical : (rampas, escaleras de concreto, galerías de circulación y corredores)	Infraestructura	Espacios físicos	7.00	M2	7,520.72	2,668,424.98	04/2023	07/2023	12/2023	09/2024
Remodelacion de espacios de circulacion horizontal y/o vertical : (escaleras de concreto) y horizontal (corredores)	Infraestructura	Espacios físicos	3.00	M2	80.47	104,905.46	04/2023	07/2023	02/2024	03/2024
Remodelacion de ambiente de gestion administrativa y	Infraestructura	Ambientes	22.00	M2	321.02	418,500.70	04/2023	07/2023	01/2024	06/2024

pedagógica : Dirección, Secretaría/Mesa de Partes más espera, Sala de Reuniones, Archivo, 02 depósitos de materiales de oficina, Secretaría Académica más espera, Unidad Académica más secretaria, Coordinación Académica, Coordinación Programa Educación Primaria, Coordinación Programa Idiomas: Inglés, Unidad de Investigación más secretaria, Unidad de Formación Continua, Unidad Administrativa más secretaria, Área de calidad, Caja/Tesorería, Contabilidad, Sala de Docentes más Kitchenette y estar.										
Construcción de ambiente complementario : Asesoría de Tesis	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	54.73	403,300.41	04/2023	07/2023	12/2023	09/2024
Remodelación de ambiente de bienestar estudiantil : Unidad de Bienestar y Empleabilidad, Tópico, Soporte Psicológico, Asistencia Social, hall espera, Lactario.	Infraestructura	Ambientes	6.00	M2	66.86	87,162.66	04/2023	07/2023	01/2024	06/2024
Construcción de ambiente de preparación y expendio de alimentos : Comedor, Cocina tipo B, ingreso personal, almacén de alimentos, depósito de combustible, limpieza 03 - comedor, 03 quioscos.	Infraestructura	Ambientes	9.00	M2	216.93	677,882.30	04/2023	07/2023	12/2023	09/2024
Remodelación de ambiente de servicios generales : Depósito 01, impresiones, cuarto TIC, almacén general, vigilancia 01, limpieza 01.	Infraestructura	Ambientes	6.00	M2	54.34	70,840.84	04/2023	07/2023	01/2024	06/2024
Construcción de ambiente de servicios generales : Módulo de conectividad, soporte técnico, maestranza, vigilancia 02, depósito implementos deportivos, depósito de materiales educativos, residuos sólidos, limpieza 02, limpieza 04, cuarto de cisterna.	Infraestructura	Ambientes	10.00	M2	197.81	1,355,364.01	04/2023	07/2023	12/2023	09/2024
Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores : SS.HH. estudiantes, SS.HH. docentes, SS.HH. público, SS.HH. personas con discapacidad.	Infraestructura	Ambientes	14.00	M2	136.04	1,034,961.90	04/2023	07/2023	12/2023	09/2024
Remodelación de servicios higiénicos y/o vestidores : SS.HH. + ducha estudiantes, SS.HH. docentes.	Infraestructura	Ambientes	4.00	M2	45.54	59,368.64	04/2023	07/2023	01/2024	06/2024
Remodelación de cerco perimétrico :	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	Metros lineales	24.71	6,575.50	04/2023	07/2023	06/2024	09/2024
Construcción de cerco perimétrico :	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	Metros lineales	1,271.93	681,161.24	04/2023	07/2023	05/2024	09/2024
Implementación de módulo de atención temporal : Ambientes para Contingencia (acondicionamiento de 11 ambientes existentes, instalación de 5 módulos prefabricados y 3 espacios para servicios generales)	Infraestructura	Ambientes	19.00	M2	4,822.50	1,884,113.47	04/2023	07/2023	12/2023	01/2024
2. Adecuado y suficiente mobiliario y equipo en ambientes básicos y complementarios										
Adquisición de mobiliario de aula :	Mobiliario	Número de mobiliario	390.00		0.00	126,933.11	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de aula de cómputo :	Mobiliario	Número de mobiliario	64.00		0.00	21,521.98	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de biblioteca :	Mobiliario	Número de mobiliario	88.00		0.00	29,930.31	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de biblioteca y/o centro de recursos : Centro de Recursos	Mobiliario	Número de mobiliario	49.00		0.00	12,725.57	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de laboratorio y/o taller : Laboratorio de Idiomas	Mobiliario	Número de mobiliario	128.00		0.00	43,043.98	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de mobiliario de laboratorio : Laboratorio de Ciencias	Mobiliario	Número de mobiliario	52.00		0.00	41,807.81	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de mobiliario de sala de usos múltiples :	Mobiliario	Número de mobiliario	212.00		0.00	54,117.00	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de mobiliario de ambientes complementarios : De Ambientes de gestión administrativa y pedagógica, de ambientes para el bienestar estudiantil y de ambientes para los servicios generales.	Mobiliario	Número de mobiliario	433.00		0.00	246,546.63	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de equipamiento de aula :	Equipamiento	Número de equipamiento	30.00		0.00	79,609.06	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de equipamiento de aula de innovación pedagógica : Aula de cómputo	Equipamiento	Número de equipamiento	64.00		0.00	220,259.02	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de equipo para biblioteca :	Equipamiento	Número de equipamiento	7.00		0.00	30,191.65	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios : Centro de Recursos	Equipamiento	Número de equipamiento	5.00		0.00	13,268.18	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller : Laboratorio de idiomas	Equipamiento	Número de equipamiento	192.00		0.00	463,334.54	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller : Laboratorio de Ciencias	Equipamiento	Número de equipamiento	7.00		0.00	160,484.81	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de equipo de sala de usos múltiples :	Equipamiento	Número de equipamiento	6.00		0.00	56,077.58	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024
Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios : Ambientes de gestión administrativa y pedagógica, ambientes para el	Equipamiento	Número de equipamiento	82.00		0.00	250,597.93	04/2023	07/2023	05/2024	07/2024

bienestar y ambientes para los servicios generales.										
3. Suficientes conocimientos de los docentes en el uso de las TIC como herramientas para la formación docente en EIB y la educación en idiomas.										
Capacitación de capacidad humana: Capacitación en el uso de las TIC como herramientas para la formación de los docentes del Programa de Estudios de Educación Primaria Intercultural Bilingüe.	Intangibles	Horas de capacitación	52.00		0.00	11,703.91	04/2023	07/2023	07/2024	08/2024
Capacitación de capacidad humana: Capacitación en el uso de las TIC como herramientas para la formación de los docentes del Programa de Estudios de Educación en Idiomas: Especialidad Inglés.	Intangibles	Horas de capacitación	72.00		0.00	16,162.23	04/2023	07/2023	08/2024	09/2024

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución	
Tipo de periodo	Trimestres
Número de periodos (trimestres)	7

Tipo de factor de producción	Periodos							Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 5	Trimestre 6	Trimestre 7	
Infraestructura	0.00	0.00	1,771,754.90	4,837,517.30	6,246,799.60	4,409,902.64	0.00	17,265,974.44
Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	384,417.59	192,208.80	0.00	576,626.39
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	849,215.18	424,607.59	0.00	1,273,822.77
Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,866.14	0.00	27,866.14
Subtotal	0.00	0.00	1,771,754.90	4,837,517.30	7,480,432.37	5,054,585.17	0.00	19,144,289.74
Gestión del proyecto	0.00	0.00	25,515.99	76,547.96	76,547.96	76,547.96	0.00	255,159.87
Expediente técnico	269,768.92	102,731.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,500.30
Supervisión	0.00	0.00	83,723.42	228,594.54	357,620.16	240,919.95	0.00	910,858.07
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,065.24	57,065.24
Subtotal	269,768.92	102,731.38	109,239.41	305,142.50	434,168.12	317,467.91	57,065.24	1,595,583.48
Costo de inversión viable	269,768.92	102,731.38	1,880,994.31	5,142,659.80	7,914,600.49	5,372,053.08	57,065.24	20,739,873.22
Costo de control concurrente (CCC)								334,358.11
Costo total de inversión viable								21,074,231.33

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?	Sí
Aporte de los beneficiarios (soles)	0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Tipo de factor de producción	Unidad de medida representativa	Periodos							Total meta
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 5	Trimestre 6	Trimestre 7	
Infraestructura	M2	0.00	0.00	3,743.83	4,899.80	7,895.50	5,285.14	0.00	21,824.27
Mobiliario	Número de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	471.00	0.00	1,416.00
Equipamiento	Número de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	130.00	0.00	393.00
Intangibles	Horas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	124.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación	01/2025
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)	Periodos									
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Sin Proyecto										
Operación	1,019,714.00	1,019,714.00	1,019,714.00	1,019,714.00	1,019,714.00	1,019,714.00	1,019,714.00	1,019,714.00	1,019,714.00	1,019,714.00
Mantenimiento	104,411.00	104,411.00	104,411.00	104,411.00	104,411.00	104,411.00	104,411.00	104,411.00	104,411.00	104,411.00
Con Proyecto										
Operación	1,045,874.00	1,045,874.00	1,045,874.00	1,045,874.00	1,045,874.00	1,045,874.00	1,045,874.00	1,045,874.00	1,045,874.00	1,045,874.00
Mantenimiento	0.00	81,172.00	109,451.00	82,327.00	137,670.00	113,207.00	67,362.00	83,862.00	107,917.00	151,481.00

7. Costo de inversión a precios sociales:

	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)	17,527,643.27

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo eficacia / efectividad	
Valor Actual de Costos (VAC)	18,311,530.50
Costo Anual Equivalente (CAE)	0.00
	0.00
Ratio de costo por beneficiario directo	3,153.90
Ratio de costo de capacidad de producción	0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad	En la fase de funcionamiento los costos de operación y mantenimiento, como hasta ahora, estarán a cargo de la GEREDU Cusco, entidad que se ha comprometido a realizar las gestiones correspondientes para garantizar la operación y mantenimiento del IESPP "Acomayo" durante la vida útil del proyecto (10 años). En anexos del proyecto, se adjunta el documento de compromiso indicado, suscrito debidamente por el Director de la GEREDU Cusco.		
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?	Peligros	Nivel (bajo, medio, alto)	Medidas de reducción de riesgos
	Tempestades eléctricas	Medio	El proyecto contempla 01 pararrayo de PDC con dispositivo cerrado no reactivo, en un radio de intervención de 60 mts. con 03 unidades de puesta a tierra para su disipación.
	Radiación solar	Alto	Construcción de paergolas de circulación en accesos principales y central en un ancho de 6.40 m con cobertura de policarbonato y de sombra, en la cancha deportiva se realizara cobertura de malla rashe
	Covid-19	Medio	Se considera señalética y EPP de prevención en la etapa de ejecución del proyecto.
	Sismos	Alto	Construcción de una nueva infraestructura educativa que cumpla con las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones E 0.30
	Granizadas	Medio	La cobertura del proyecto contempla estructuras resistentes a la sobre carga.
	Lluvias intensas	Medio	Se considera en el diseño de la infraestructura del proyecto, buenos sistemas de evacuación de aguas pluviales
	Inundaciones	Medio	El proyecto contempla sistemas de drenaje que evacuan las aguas pluviales
	Vientos fuertes	Medio	El proyecto considera en su formulación la Norma E. 020 de cargas, (velocidad de diseño y carga exterior de viento).
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/)	3,087,401.17		
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:	Ninguna		
8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:			

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO	FORMATO_07A.pdf	Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION	RESUMEN_EJECUTIVO.pdf	Descargar
ANEXOS	ANEXOS.pdf	Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS	INFORME_TECNICO_DE_APROBACION.pdf	Descargar
OTROS	OPINIONES PERTINENCIA BRECHA.pdf	Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD	FORMATO_N°_06B.pdf	Descargar
PLANO	PLANO.pdf	Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	DOCUMENTOS_DE_OPERACION_Y_MANTENIMIENTO.pdf	Descargar
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS	FACTIBILIDAD_DE_SERVICIOS.pdf	Descargar

Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 2/06/2026 11:55:46 Fecha de modificación: 9/06/2026 15:31:15

ETAPA: Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) ESTADO: EN REGISTRO

Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	2571690
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DEL I.E.S.P.P GREGORIA SANTOS, DISTRITO DE SICUANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s)	GREGORIA SANTOS

A Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

	Fase de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Sector responsable	EDUCACION	EDUCACION
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	PORCENTAJE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN CONDICIONES INADECUADAS	INSTALACIÓN EDUCATIVA	DEPARTAMENTAL	1

3. Institucionalidad

	Fase de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	UNIDAD FORMULADORA REGIONAL DE INVERSIONES - UFRI	UNIDAD FORMULADORA REGIONAL DE INVERSIONES - UFRI (UFGRGRCUS005 - VERONIKA JULIA CABEZUDO ZARATE)
UEI	UEI GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE PROYECTOS	UEI GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE PROYECTOS - (UEIGRGRCU166 - EDWAR JOSEPH ARIZACA ROMERO)
UEP	REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	-

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica de la(s) unidad(es) productora(s) del proyecto de inversión

Fase	Latitud/longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
Formulación y Evaluación	-14.2833556894487610 / -71.22086819213287	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	
Ejecución	-14.2833556894487610 / -71.22086819213287	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

Horizonte de evaluación	10
-------------------------	----

Fase	Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Formulación y Evaluación	SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA: EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE	PERSONA/AÑO	302	327	284	284	284	284	284	284	284	284
	SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA: EDUCACIÓN EN IDIOMAS: ESPECIALIDAD INGLÉS	PERSONA/AÑO	337	296	284	284	284	284	284	284	284	284

Ejecución	SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA: EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE	PERSONA/AÑO	302	327	284	284	284	284	284	284	284	284
	SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA: EDUCACIÓN EN IDIOMAS: ESPECIALIDAD INGLÉS	PERSONA/AÑO	337	296	284	284	284	284	284	284	284	284

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de productos/acciones	Tip o de fact or de pro duc ción	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representa tivas		C o s t o a p r e c i o m e r c a d o	Mo dal ida d de e je cu ció n	F e c h a d e i n i c i o	F e c h a d e T é r m i n o	Fec ha de ent reg a del acti vo de Oy M	U E I	
		U.M.	Me ta	U.M.	Me ta							
1. Adecuada y suficiente infraestructura básica y complementaria para la prestación del servicio educativo												
Construccion de aula de educacion superior pedagogica :	INF RAE STR UC TU RA	AULAS	6	M2	3 2 8. 3 8	22 76 89 3. 69	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6	
Construccion de aula de computo :	INF RAE STR UC TU RA	AULAS	1	M2	7 0. 8 4	32 77 59 .4 9	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6	
Remodelacion de biblioteca : (incluye depósito de libros)	INF RAE STR UC TU RA	AMBI NTES	1	M2	1 4 9. 8 7	19 53 79 .4 2	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6	
Construccion de biblioteca y/o centro de recursos : Centro de Recursos	INF RAE STR UC TU RA	AMBI NTES	1	M2	5 4. 7 3	25 32 22 .4 3	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6	
Construccion de laboratorio y/o taller : Laboratorios de Idiomas	INF RAE STR UC TU RA	AMBI NTES	2	M2	1 4 1. 6 6	63 36 33 .5 1	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6	
Construccion de laboratorio y/o taller : Laboratorios de Ciencias	INF RAE STR UC TU RA	AMBI NTES	1	M2	9 1. 8 3	41 07 48 .0 2	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6	

												6
Construccion de sala de usos multiples : (incluye cocineta y depósito)	INF RAE STR UC TU RA	AMBI NTES	1	M2	2 3 8 5 0	10 84 31 6 25	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6	
Construccion de losa deportiva : (Losa multiuso tipo I, área de seguridad y tribuna)	INF RAE STR UC TU RA	ESPAC IOS FISICO S	1	M2	7 5 0 4 1	77 70 20 .3 4	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6	
Construccion de espacio exterior : (área de ingreso, estacionamiento vehiculos, estacionamientos motocicletas y bicicletas, área de socialización, patio de honor, áreas verdes)	INF RAE STR UC TU RA	ESPAC IOS FISICO S	7	M2	6 4 8 1 0 9	18 54 43 9 18	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6	
Construccion de espacios de circulacion horizontal y/o vertical : (rampas, escaleras de concreto, galerías de circulación y corredores)	INF RAE STR UC TU RA	ESPAC IOS FISICO S	7	M2	7 5 2 0 7 2	26 68 42 4 98	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6	
Remodelacion de espacios de circulacion horizontal y/o vertical : (escaleras de concreto) y horizontal (corredores)	INF RAE STR UC TU RA	ESPAC IOS FISICO S	3	M2	8 0 4 7	10 49 05 .4 6	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6	
Remodelacion de ambiente de gestion administrativa y pedagogica : Dirección, Secretaría/Mesa de Partes más espera, Sala de Reuniones, Archivo, 02 depósitos de materiales de oficina, Secretaría Académica más espera, Unidad Académica más secretaria, Coordinación Académica, Coordinación Programa Educación Primaria, Coordinación Programa Idiomas: Inglés, Unidad de Investigación más secretaria, Unidad de Formación Continua, Unidad Administrativa más secretaria, Área de calidad, Caja/Tesorería, Contabilidad, Sala de Docentes más Kitchenette y estar.	INF RAE STR UC TU RA	AMBI NTES	2 2	M2	3 2 1 0 2	41 85 00 .7 0	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6	
Construccion de ambiente complementario : Asesoría de Tesis	INF RAE STR UC TU RA	AMBI NTES	1	M2	5 4 7 3	40 33 00 .4 1	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6	
Remodelacion de ambiente de bienestar estudiantil : Unidad de Bienestar y Empleabilidad,Tópico, Soporte Psicológico, Asistencia Social , hall espera, Lactario.	INF RAE STR UC TU RA	AMBI NTES	6	M2	6 6 8 6	87 16 2 66	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6	

Construccion de ambiente de preparacion y expendio de alimentos : Comedor, Cocina tipo B, ingreso personal, almacén de alimentos, depósito de combustible, limpieza 03 - comedor, 03 quioscos.	INFRAESTRUTURA	AMBIENTES	9	M2	216.93	6778.8230	ADMINISTRACIÓN DIRECTIVA	310.626	3012.200	3032.031	UEIGRCU166
Remodelacion de ambiente de servicios generales : Depósito 01, impresiones, cuarto TIC, almacén general, vigilancia 01, limpieza 01.	INFRAESTRUTURA	AMBIENTES	6	M2	54.34	7084.084	ADMINISTRACIÓN DIRECTIVA	310.626	3012.200	3032.031	UEIGRCU166
Construccion de ambiente de servicios generales : Módulo de conectividad, soporte técnico, mastranza, vigilancia 02, depósito implementos deportivos, depósito de materiales educativos, residuos sólidos, limpieza 02, limpieza 04, cuarto de cisterna.	INFRAESTRUTURA	AMBIENTES	10	M2	197.81	1355.36401	ADMINISTRACIÓN DIRECTIVA	310.626	3012.200	3032.031	UEIGRCU166
Construccion de servicios higienicos y/o vestidores : SS.HH. estudiantes, SS.HH. docentes, SS.HH. público, SS.HH. personas con discapacidad.	INFRAESTRUTURA	AMBIENTES	14	M2	136.04	1034.96190	ADMINISTRACIÓN DIRECTIVA	310.626	3012.200	3032.031	UEIGRCU166
Remodelacion de servicios higienicos y/o vestidores : SS.HH. + ducha estudiantes, SS.HH. docentes.	INFRAESTRUTURA	AMBIENTES	4	M2	45.54	5936.864	ADMINISTRACIÓN DIRECTIVA	310.626	3012.200	3032.031	UEIGRCU166
Remodelacion de cerco perimetrico :	INFRAESTRUTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	METROS LINEALES	24.71	6575.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTIVA	310.626	3012.200	3032.031	UEIGRCU166
Construccion de cerco perimetrico :	INFRAESTRUTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	METROS LINEALES	127.13	6811.6124	ADMINISTRACIÓN DIRECTIVA	310.626	3012.200	3032.031	UEIGRCU166
Implementacion de modulo de atencion temporal : Ambientes para Contingencia (acondicionamiento de 11 ambientes existentes, instalación de 5 módulos prefabricados y 3 espacios para servicios generales)	INFRAESTRUTURA	AMBIENTES	19	M2	482.50	1884.11347	ADMINISTRACIÓN DIRECTIVA	310.626	3012.200	3032.031	UEIGRCU166

2. Adecuado y suficiente mobiliario y equipo en ambientes básicos y complementarios

Adquisición de mobiliario de aula :	MO BILI ARIO	NÚME RO DE MOBILI ARIO	3 9 0		0	12 69 33 .1 1	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Adquisición de aula de computo :	MO BILI ARIO	NÚME RO DE MOBILI ARIO	6 4		0	21 52 1. 98	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Adquisición de biblioteca :	MO BILI ARIO	NÚME RO DE MOBILI ARIO	8 8		0	29 93 0. 31	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Adquisición de biblioteca y/o centro de recursos : Centro de Recursos	MO BILI ARIO	NÚME RO DE MOBILI ARIO	4 9		0	12 72 5. 57	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Adquisición de laboratorio y/o taller : Laboratorio de Idiomas	MO BILI ARIO	NÚME RO DE MOBILI ARIO	1 2 8		0	43 04 3. 98	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Adquisición de mobiliario de laboratorio : Laboratorio de Ciencias	MO BILI ARIO	NÚME RO DE MOBILI ARIO	5 2		0	41 80 7. 81	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Adquisición de mobiliario de sala de usos múltiples :	MO BILI ARIO	NÚME RO DE MOBILI ARIO	2 1 2		0	54 11 7	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Adquisición de mobiliario de ambientes complementarios : De Ambientes de gestión administrativa y pedagógica, de ambientes para el bienestar estudiantil y de ambientes para los servicios generales.	MO BILI ARIO	NÚME RO DE MOBILI ARIO	4 3 3		0	24 65 46 .6 3	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	3/0 3/2 031	U E I G R G R C U 1 6 6

Adquisición de equipamiento de aula :	EQ UIP AMI ENT O	NÚME RO DE EQUIP AMIENT O	3 0		0	79 60 9. 06	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	30 / 32 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Adquisición de equipamiento de aula de innovación pedagógica : Aula de cómputo	EQ UIP AMI ENT O	NÚME RO DE EQUIP AMIENT O	6 4		0	22 02 59 .0 2	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	30 / 32 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Adquisición de equipo para biblioteca :	EQ UIP AMI ENT O	NÚME RO DE EQUIP AMIENT O	7		0	30 19 1. 65	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	30 / 32 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios : Centro de Recursos	EQ UIP AMI ENT O	NÚME RO DE EQUIP AMIENT O	5		0	13 26 8. 18	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	30 / 32 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller : Laboratorio de idiomas	EQ UIP AMI ENT O	NÚME RO DE EQUIP AMIENT O	1 9 2		0	46 33 34 .5 4	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	30 / 32 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller : Laboratorio de Ciencias	EQ UIP AMI ENT O	NÚME RO DE EQUIP AMIENT O	7		0	16 04 84 .8 1	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	30 / 32 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Adquisición de equipo de sala de usos múltiples :	EQ UIP AMI ENT O	NÚME RO DE EQUIP AMIENT O	6		0	56 07 7. 58	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	30 / 32 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios : Ambientes de gestión administrativa y pedagógica, ambientes para el bienestar y ambientes para los servicios generales.	EQ UIP AMI ENT O	NÚME RO DE EQUIP AMIENT O	8 2		0	25 05 97 .9 3	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0 / 1 2 / 2 0 3 0	30 / 32 031	U E I G R G R C U 1 6 6
3. Suficientes conocimientos de los docentes en el uso de las TIC como herramientas para la formación docente en EIB y la educación en idiomas.											

Capacitación de capacidad humana : Capacitación en el uso de las TIC como herramientas para la formación de los docentes del Programa de Estudios de Educación Primaria Intercultural Bilingüe.	INT AN GIB LES	HORA S DE CAPA CITACI ÓN	5 2		0	11 70 3. 91	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0/ 1 2/ 0 3 0	30 32 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Capacitación de capacidad humana : Capacitación en el uso de las TIC como herramientas para la formación de los docentes del Programa de Estudios de Educación en Idiomas: Especialidad Inglés.	INT AN GIB LES	HORA S DE CAPA CITACI ÓN	7 2		0	16 16 2 23	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0/ 1 2/ 0 3 0	30 32 031	U E I G R G R C U 1 6 6
Subtotal: S/.						19 .1 44 .2 89 .7 4					
GESTION DEL PROYECTO: S/.						25 5. 15 9. 87	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0/ 1 2/ 0 3 0		U E I G R G R C U 0 5 3
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.						37 2. 50 0. 30	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0/ 1 2/ 0 3 0		U E I G R G R C U 0 5 3
SUPERVISIÓN: S/.						91 0. 85 8. 07	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 2 6	3 0/ 1 2/ 0 3 0		U E I G R G R C U 0 5 3
LIQUIDACIÓN: S/.						57 0. 65 .2 4	AD MI NI ST RA CI ÓN DI RE CT A	3 / 0 6 / 2 0 3 0	3 0/ 1 2/ 2 3 0		U E I G R G R C U 0 5 3
Costo de inversión actualizado: S/.						20 .7 39 .8 73 .2 2					
Costo de control concurrente (CCC): S/.						33 4. 35 8. 11					
Costo de controversias: S/.						0. 00					
Monto de carta fianza: S/.						0.					

	00	
Costo total de la inversión actualizado: S/.	21 .0 74 .2 31 .3 3	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	01/2025
Horizonte de evaluación (años)	10

Costos (soles)	Periodos									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto										
Operación	1019714	1019714	1019714	1019714	1019714	1019714	1019714	1019714	1019714	1019714
Mantenimiento	104411	104411	104411	104411	104411	104411	104411	104411	104411	104411
Con Proyecto										
Operación	1045874	1045874	1045874	1045874	1045874	1045874	1045874	1045874	1045874	1045874
Mantenimiento	0	81172	109451	82327	137670	113207	67362	83862	107917	151481

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		Alternativa Recomendada
Costo eficacia/ efectividad		
Valor Actual de Costos (VAC)		18311530.50
Costo Anual Equivalente (CAE)		0
		0.00
Ratio de costo por beneficiario directo		3,153.90
Ratio de costo de capacidad de producción		0.00

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

[SUSTENTO DE MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL P.I..pdf](#)
